

BAHAN PAPARAN RANCANGAN PROYEK

# SIPANDU-WBK

Sistem Informasi Pembinaan Satuan Pendidikan Terpadu  
berbasis Wilayah Bebas dari Korupsi



SIM Binsat 6 Komponen



E-Learning



E-Pustaka



Portal Zona Integritas

Satuan

**Resimen Induk Daerah Militer**

Platform

**Laravel · Web**

Periode

**Okt – Nov 2026**



# Pokok Bahasan

Paparan ini menyajikan latar belakang, rancangan sistem, kerangka teknis, metodologi penelitian, serta rencana kerja 2 bulan.

01

## Latar Belakang & Permasalahan

6 komponen Binsat, kondisi saat ini, tuntutan Zona Integritas

02

## Solusi & Ruang Lingkup

Konsep SIPANDU-WBK, tujuan, manfaat, dukungan area ZI

03

## Blueprint Sistem

Arsitektur, modul Binsat, Indeks Kesiapan, LMS, E-Pustaka, Portal WBK

04

## Kerangka Teknis & Keamanan

Teknologi Laravel, hak akses berbasis peran, lapisan keamanan

05

## Metodologi & Pengujian

R&D model Scrum, instrumen penelitian, KPI keberhasilan

06

## Timeline & Rencana Kerja

Gantt 8 minggu, sprint, milestone, tim, risiko, keputusan

## 6 Komponen Pembinaan Satuan (Binsat)

Kesiapan operasional satuan pendidikan ditentukan oleh enam komponen pembinaan yang harus dikelola, dipantau, dan dilaporkan secara berkelanjutan.



1

### Pembinaan Organisasi

Penataan struktur dan fungsi satuan agar sesuai dengan TOP (Tabel Organisasi dan Peralatan) yang berlaku.



2

### Pembinaan Personel

Pengelolaan kekuatan, pemenuhan jabatan, dan pemeliharaan moril prajurit.



3

### Pembinaan Materiil

Perawatan, pemeliharaan, dan inventarisasi alutsista serta perlengkapan satuan.



4

### Pembinaan Fasilitas / Pangkalan

Pemeliharaan pangkalan, perkantoran, perumahan prajurit, dan fasilitas pendukung kerja.



5

### Pembinaan Latihan

Latihan bertahap, bertingkat, dan berlanjut guna memelihara kesiapsiagaan operasional.



6

### Pembinaan Doktrin / Piranti Lunak

Penerapan dan pemahaman ketentuan, petunjuk, atau naskah dinas yang mengatur cara kerja satuan.

# Kondisi Saat Ini & Permasalahan

Hasil observasi awal — akan divalidasi pada Minggu 1 melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen.



## Data Binsat tersebar di berkas fisik & Excel tiap seksi

Sulit direkap, rawan hilang, data tidak sinkron



## Laporan kesiapan disusun manual menjelang pemeriksaan

Memakan waktu, tidak real-time



## Hanjar & naskah doktrin masih berbentuk cetak

Biaya cetak tinggi, versi naskah tidak terkontrol



## Evaluasi belajar siswa dilakukan manual

Rekap nilai lambat, potensi kesalahan input



## Koleksi perpustakaan belum terdigitalisasi

Akses terbatas pada jam dan lokasi tertentu



## Pengaduan & survei kepuasan belum terpusat

Bukti dukung penilaian Zona Integritas lemah



## Tuntutan Zona Integritas menuju WBK

PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 mensyaratkan instansi membangun ZI melalui 6 area perubahan, termasuk:

- ◆ Inovasi pelayanan berbasis TI
- ◆ Keterbukaan informasi publik
- ◆ Sarana pengaduan & whistleblowing
- ◆ Survei kepuasan (IPAK & IPKP)
- ◆ Penguatan akuntabilitas kinerja

→ **Dibutuhkan satu platform digital terpadu.**

# SIPANDU-WBK: Satu Platform, Lima Pilar

Integrasi pengelolaan satuan, pendidikan, literasi, dan integritas dalam satu aplikasi web berbasis Laravel.

## SIPANDU-WBK

SIAP OPERASIONAL · CERDAS · BERSIH



### SIM Binsat

- ◆ 6 komponen pembinaan
- ◆ Laporan otomatis PDF/Excel
- ◆ QR materiil & aset



### E-Learning (LMS)

- ◆ Kelas, materi, hanjar
- ◆ Ujian daring & nilai otomatis
- ◆ Rapor & sertifikat QR



### E-Pustaka

- ◆ Katalog & e-book reader
- ◆ Sirkulasi buku fisik
- ◆ Watermark & anti-unduh



### Portal WBK

- ◆ Pengaduan / WBS bertiket
- ◆ Survei SKM, IPAK, IPKP
- ◆ Lapor gratifikasi & PPID



**Pilar ke-5 — Dashboard Pimpinan:** Indeks Kesiapan Binsat real-time, statistik pendidikan & literasi, kinerja pelayanan WBK sebagai dasar pengambilan keputusan.

# Tujuan & Manfaat

Sasaran yang terukur bagi pimpinan, pelaksana, pendidik, siswa, dan masyarakat.

- 1

**SIM Binsat terukur**  
Mengelola 6 komponen dengan Indeks Kesiapan Binsat otomatis
- 2

**Pendidikan & literasi digital**  
LMS dan E-Pustaka terintegrasi dengan data personel/siswa
- 3

**Mendukung Zona Integritas**  
Pengaduan, survei, gratifikasi, dan keterbukaan informasi
- 4

**Kualitas teruji**  
Diukur dengan ISO/IEC 25010 & System Usability Scale (SUS)

| Pihak               | Manfaat                                      |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Pimpinan            | Dashboard kesiapan real-time untuk keputusan |
| Seksi / Staf        | Input data cepat, laporan otomatis           |
| Gadik               | Distribusi materi, ujian & penilaian daring  |
| Siswa / Serdik      | Akses hanjar, materi, e-book kapan saja      |
| Tim Zona Integritas | Bukti dukung digital 6 area perubahan        |
| Masyarakat          | Informasi publik & pengaduan transparan      |
| Akademik            | Referensi SI satuan pendidikan militer       |

# Dukungan terhadap 6 Area Perubahan Zona Integritas

Setiap fitur dirancang agar langsung menjadi bukti dukung Lembar Kerja Evaluasi ZI (PermenPAN-RB No. 90/2021).



## 1. Manajemen Perubahan

Agenda & dokumentasi kegiatan ZI, etalase inovasi pelayanan.



## 2. Penataan Tatalaksana

SOP digital, e-office, keterbukaan informasi publik (PPID).



## 3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Modul personel, rekam diklat & latihan, data moril.



## 4. Penguatan Akuntabilitas

Dashboard kinerja, laporan otomatis, Indeks Kesiapan Binsat.



## 5. Penguatan Pengawasan

Whistleblowing System, lapor gratifikasi, audit log seluruh aktivitas.



## 6. Kualitas Pelayanan Publik


Standar & maklumat pelayanan, Survei Kepuasan, pengaduan ber-SLA.



**Komponen hasil:** Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) & Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dikumpulkan langsung melalui modul survei.

# Arsitektur Sistem

Pola **Modular Monolith** — satu aplikasi Laravel dengan pemisahan per domain.

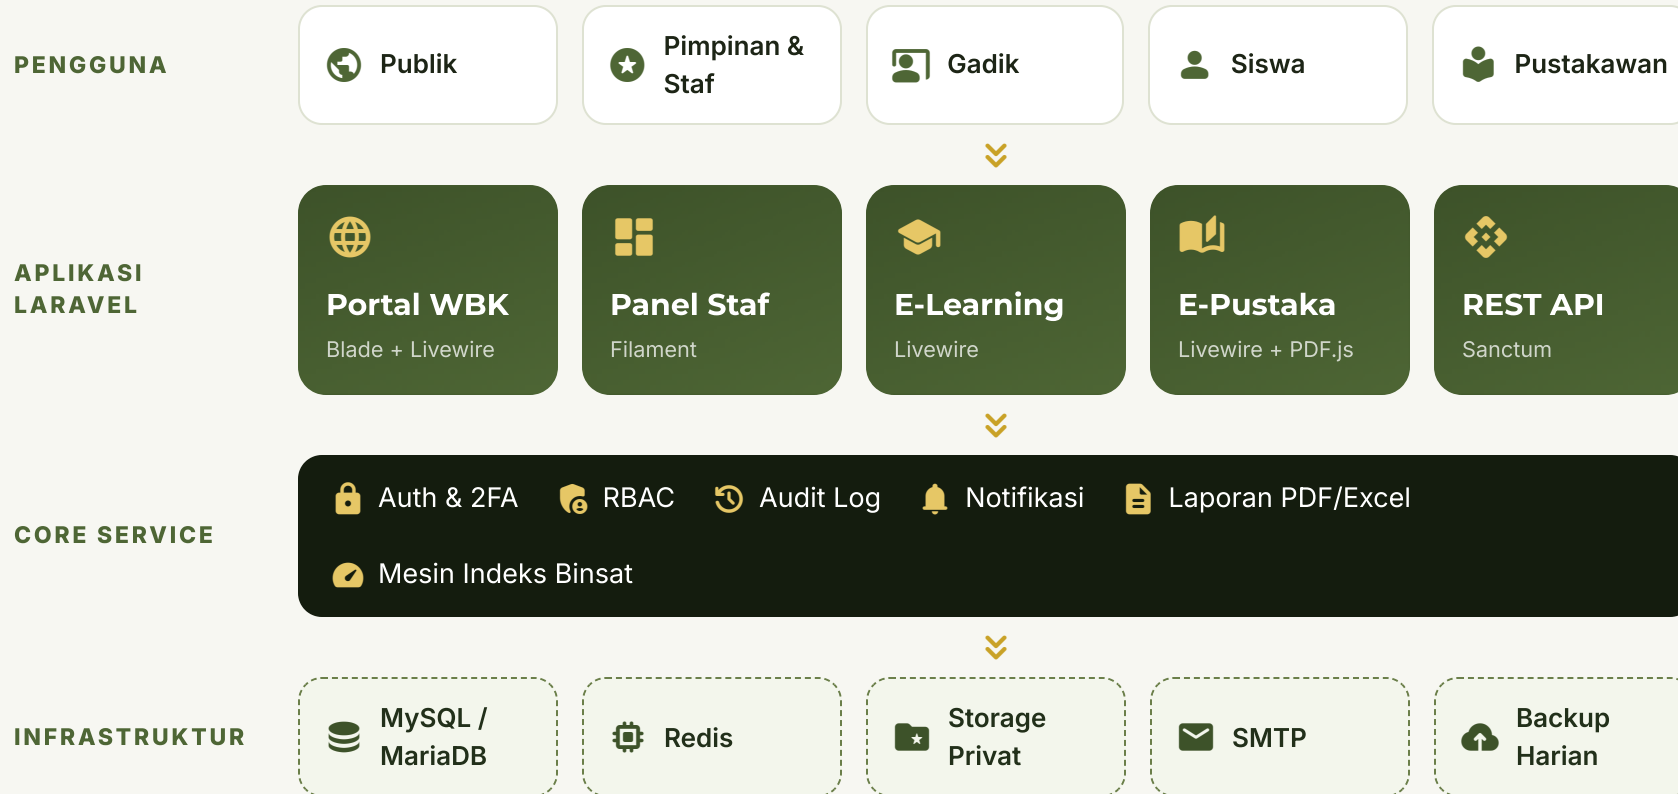

## Mengapa Modular Monolith?

- ◆ Cocok untuk tim kecil & tenggat 2 bulan
- ◆ Satu kali deploy, mudah dipelihara admin satuan
- ◆ Kode tetap rapi per domain (Binsat, Pendidikan, Pustaka, WBK)
- ◆ Dapat dipecah menjadi layanan terpisah di masa depan
- ◆ REST API siap untuk PWA / aplikasi mobile

# Modul SIM Binsat — Fitur per Komponen

Setiap komponen memiliki pencatatan, monitoring, approval, dan laporan otomatis.


|  Organisasi                                                                                                                                        |  Personel                                                                                                                                                             |  Materiil                                                                                                                                |  Fasilitas                                                                                                                                                   |  Latihan                                                                                                                                        |  Doktrin                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Data satuan (struktur pohon)</li><li>◆ TOP / DSPP jabatan</li><li>◆ Struktur riil vs TOP</li><li>◆ Analisis gap otomatis</li><li>◆ Bagan organisasi</li><li>◆ Arsip SK organisasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Data personel (impor Excel)</li><li>◆ Kekuatan DSPP vs Nyata</li><li>◆ Jabatan kosong / Plt</li><li>◆ Riwayat pangkat &amp; jabatan</li><li>◆ Kesiapan harian</li><li>◆ Survei &amp; pembinaan moril</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Inventaris per kategori</li><li>◆ Kondisi B / RR / RB</li><li>◆ Jadwal harwat</li><li>◆ Mutasi + approval</li><li>◆ Label QR per item</li><li>◆ Rekap kesiapan materiil</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Gedung, kelas, barak, lapangan</li><li>◆ Kondisi &amp; kapasitas</li><li>◆ Rumah dinas &amp; penghuni</li><li>◆ Tiket perbaikan</li><li>◆ Booking ruang / lapangan</li><li>◆ Dokumentasi foto</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Program tahunan → mingguan</li><li>◆ Jenis latihan</li><li>◆ Jadwal, peserta, pelatih</li><li>◆ Hasil (menembak, Garjas)</li><li>◆ % terlaksana vs rencana</li><li>◆ Dokumentasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Repositori naskah dinas</li><li>◆ Versi &amp; status berlaku</li><li>◆ Klasifikasi akses</li><li>◆ Jadwal sosialisasi</li><li>◆ Tes pemahaman</li><li>◆ Bukti baca naskah</li></ul> |

 Data berklasifikasi **RAHASIA tidak disimpan** di sistem. Data senjata/munisi dapat dibatasi hanya rekap jumlah sesuai kebijakan satuan.

# Indeks Kesiapan Binsat

Skor 0–100 per komponen dihitung otomatis dari data, digabung dengan bobot yang dapat dikonfigurasi sesuai ketentuan resmi.

| Komponen   | Rumus Awal (Draf)                                                        | Bobot           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Organisasi | Jabatan terbentuk ÷ Jabatan TOP                                          | 15% <div></div> |
| Personel   | 60% Pemenuhan + 20% Kesiapan + 20% Moril                                 | 20% <div></div> |
| Materiil   | $(B \times 1 + RR \times 0,5 + RB \times 0) \div \text{Total item}$      | 20% <div></div> |
| Fasilitas  | $(B \times 1 + RR \times 0,5 + RB \times 0) \div \text{Total fasilitas}$ | 15% <div></div> |
| Latihan    | 70% Terlaksana/Rencana + 30% Rata-rata nilai                             | 20% <div></div> |
| Doktrin    | 50% Naskah mutakhir + 50% Tes pemahaman                                  | 10% <div></div> |

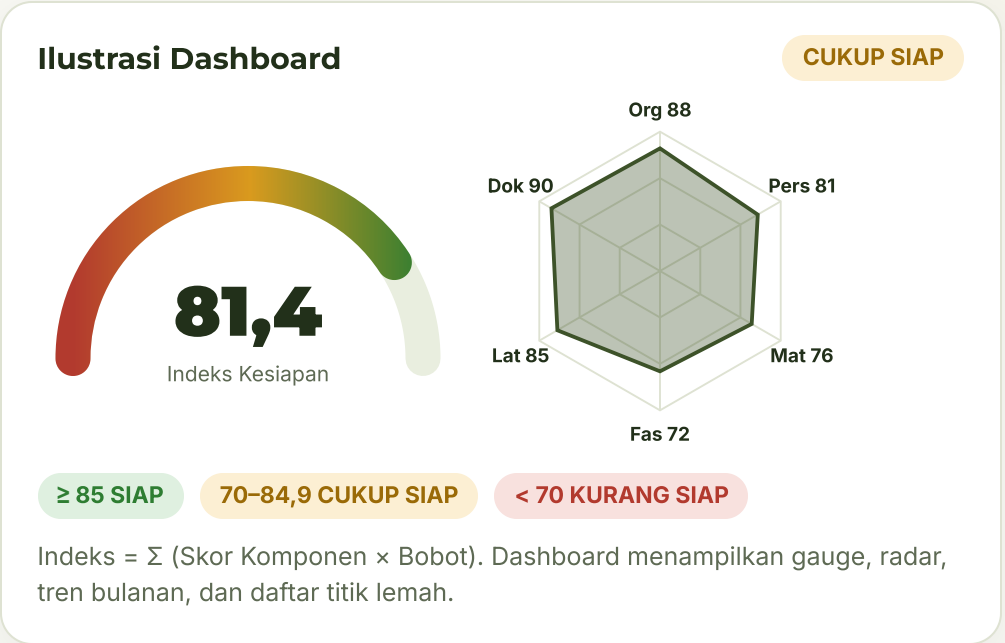


# E-Learning (Learning Management System)

Model **blended learning** — tatap muka di kelas/lapangan dipadukan dengan materi dan evaluasi daring.



## Alur Ujian Daring



# E-Pustaka (Perpustakaan Digital)

Koleksi fisik & digital dalam satu katalog — hanjar dari E-Pustaka dapat langsung dipasang sebagai materi kelas di E-Learning.



## Katalog & Pencarian

Judul, pengarang, ISBN, kategori, lokasi rak



## Koleksi Fisik

Eksemplar ber-barcode / QR



## Keanggotaan

Otomatis dari data personel & siswa



## Statistik

Buku terpopuler, pembaca teraktif



## E-Book Reader

PDF.js tanpa unduh + watermark nama/NRP



## Sirkulasi

Pinjam, kembali, perpanjang, reservasi, sanksi



## Fitur Pembaca

Bookmark, riwayat baca, favorit



## Usulan Buku

Usulan pengadaan dari gadik & siswa

## Alur Peminjaman Buku Fisik

1

### Cari di katalog

Cek ketersediaan; jika kosong → reservasi antrean

2

### Scan kartu & barcode buku

Pustakawan mencatat transaksi pinjam (tenggat 7 hari)

3

### Notifikasi H-1

Peringat otomatis sebelum jatuh tempo

4

### Pengembalian

Scan; keterlambatan otomatis dicatat sanksi

# Portal WBK & Alur Pengaduan

Wajah publik satuan: transparan, mudah diakses, dan setiap pengaduan terlacak hingga tuntas.

## Fitur Portal Publik

- ◆ Beranda, profil, struktur & pejabat
- ◆ Berita, agenda, galeri
- ◆ Standar & maklumat pelayanan
- ◆ Informasi publik (PPID)
- ◆ Pengaduan / WBS (bisa anonim)
- ◆ Lapor gratifikasi
- ◆ Survei SKM, IPAK, IPKP + hasil
- ◆ Etalase inovasi, FAQ, kontak
- ◆ Katalog E-Pustaka publik

### Kirim

Pelapor isi form  
+ bukti

### Tiket

Nomor tiket &  
kode akses

### Verifikasi

Tim ZI ≤ 3 hari  
kerja

### Disposisi

Pimpinan ke unit  
terkait

**Tindak Lanjut**  
≤ 14 hari kerja

### Selesai

Tanggapan ke  
pelapor



### Anonim & Aman

Identitas pelapor dapat  
disembunyikan; kode akses di-  
hash.



### Lacak Status

Pelapor memantau progres  
dengan nomor tiket.



### Peringatan SLA

Pengaduan melewati batas  
waktu ditandai merah.

# Aktor & Hak Akses (RBAC)

Prinsip **need-to-know**: setiap pengguna hanya melihat data sesuai peran dan satuannya.

| Modul                   | Super Admin | Pimpinan        | Operator Binsat | Gadik         | Siswa           | Pustakawan | Tim ZI | Publik  |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------|---------|
| Pengguna & Role         | Kelola      | Lihat           | —               | —             | —               | —          | —      | —       |
| Binsat 6 Komponen       | Kelola      | Lihat + Setujui | Kelola seksinya | Lihat doktrin | —               | —          | —      | —       |
| Dashboard Indeks        | Lihat       | Lihat           | Seksinya        | —             | —               | —          | —      | —       |
| E-Learning              | Kelola      | Lihat           | —               | Kelola kelas  | Belajar & ujian | —          | —      | —       |
| E-Pustaka               | Kelola      | Baca            | Baca            | Baca + usul   | Baca            | Kelola     | Baca   | Katalog |
| Konten Portal           | Kelola      | Lihat           | —               | —             | —               | —          | Kelola | Lihat   |
| Pengaduan / Gratifikasi | Lihat       | Disposisi       | —               | Lapor         | Lapor           | Lapor      | Kelola | Lapor   |
| Audit Log               | Lihat       | Lihat           | —               | —             | —               | —          | Lihat  | —       |

# Technology Stack

Teknologi open-source, matang, dan sesuai lingkungan pengembangan **Laragon** yang sudah digunakan.

BACKEND

Laravel 12/13PHP 8.3+Eloquent ORMQueue & SchedulerSanctum API

ANTARMUKA

Filament v4Livewire 3Alpine.jsTailwind CSSApexChartsPDF.js

DATA

MySQL 8 / MariaDBRedisLaravel ScoutStorage Privat

PACKAGE KUNCI

spatie/permission  
simple-qrcode  
spatie/activitylog  
spatie/medialibrary  
spatie/backup  
filament-shield  
maatwebsite/excel  
dompdf

KUALITAS

PestLaravel Pint (PSR-12)LarastanGitHub Actions CIOWASP ZAPk6

SERVER

Ubuntu LTSNginxPHP-FPMSupervisorHTTPS / TLSLaragon (dev)

# Blueprint Keamanan Berlapis

Dirancang untuk lingkungan militer dan selaras dengan UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.



## Jaringan

HTTPS/TLS, firewall; Panel Staf hanya via intranet/VPN.



## Autentikasi

Password kuat, 2FA (TOTP), kunci akun setelah 5x gagal.



## Otorisasi

RBAC + Policy per model, filter data per satuan.



## Data

Enkripsi kolom sensitif, hash kode akses, nama file acak.



## Aplikasi

Proteksi CSRF, XSS, SQLi; validasi file; rate limit & CAPTCHA.



## Konten Digital

Reader tanpa unduh, watermark dinamis, signed URL berbatas waktu.



## Pengawasan

Audit log semua perubahan, log login, alert aktivitas mencurigakan.



## Ketersediaan

Backup harian terenkripsi, retensi 30 hari, uji restore bulanan.

# Research & Development dengan Model Scrum

Pengembangan iteratif dengan sprint 1 minggu — setiap Jumat hasil didemokan kepada Product Owner.



| Teknik Pengumpulan Data | Sasaran                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Observasi               | Proses kerja seksi Pers, Log, Ops/Diklat, Perpustakaan |
| Wawancara               | Pejabat staf, Gadik, Pustakawan, Tim ZI, siswa         |
| Studi Dokumen           | TOP/DSPP, format laporan, kurikulum, LKE ZI            |
| Kuesioner               | Pengguna akhir (pra & pasca implementasi)              |

10–15  
Pejabat/Staf

10–20  
Gadik

30–50  
Siswa/Serdik

3–5  
Pustakawan & ZI

# Rencana Pengujian & Indikator Keberhasilan

Kualitas diukur secara objektif sebelum aplikasi dinyatakan siap digunakan.

≥95%

Skenario black-box lulus

≥68

Skor SUS (ideal ≥ 80)

≥81%

Kelayakan ISO 25010  
(Sangat Layak)

0

Kerentanan High / Critical  
OWASP


<5 mnt

Penyusunan laporan Binsat

| Jenis Uji           | Waktu               | Pelaksana                 | Alat / Metode                         |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Unit & Feature Test | Setiap sprint       | Developer                 | Pest / PHPUnit                        |
| Black-Box Test      | Akhir setiap sprint | QA                        | Lembar skenario uji                   |
| Performance Test    | Minggu 8            | Developer                 | k6 / JMeter — 200 user ujian serentak |
| Security Test       | Minggu 8            | Developer                 | OWASP ZAP + checklist OWASP Top 10    |
| UAT & Kuesioner     | Minggu 8            | Pengguna kunci & peneliti | Lembar UAT, SUS, ISO/IEC 25010        |

# Jadwal Pelaksanaan 2 Bulan

5 Oktober – 27 November 2026 · 8 minggu / 40 hari kerja + 1 minggu pendampingan opsional

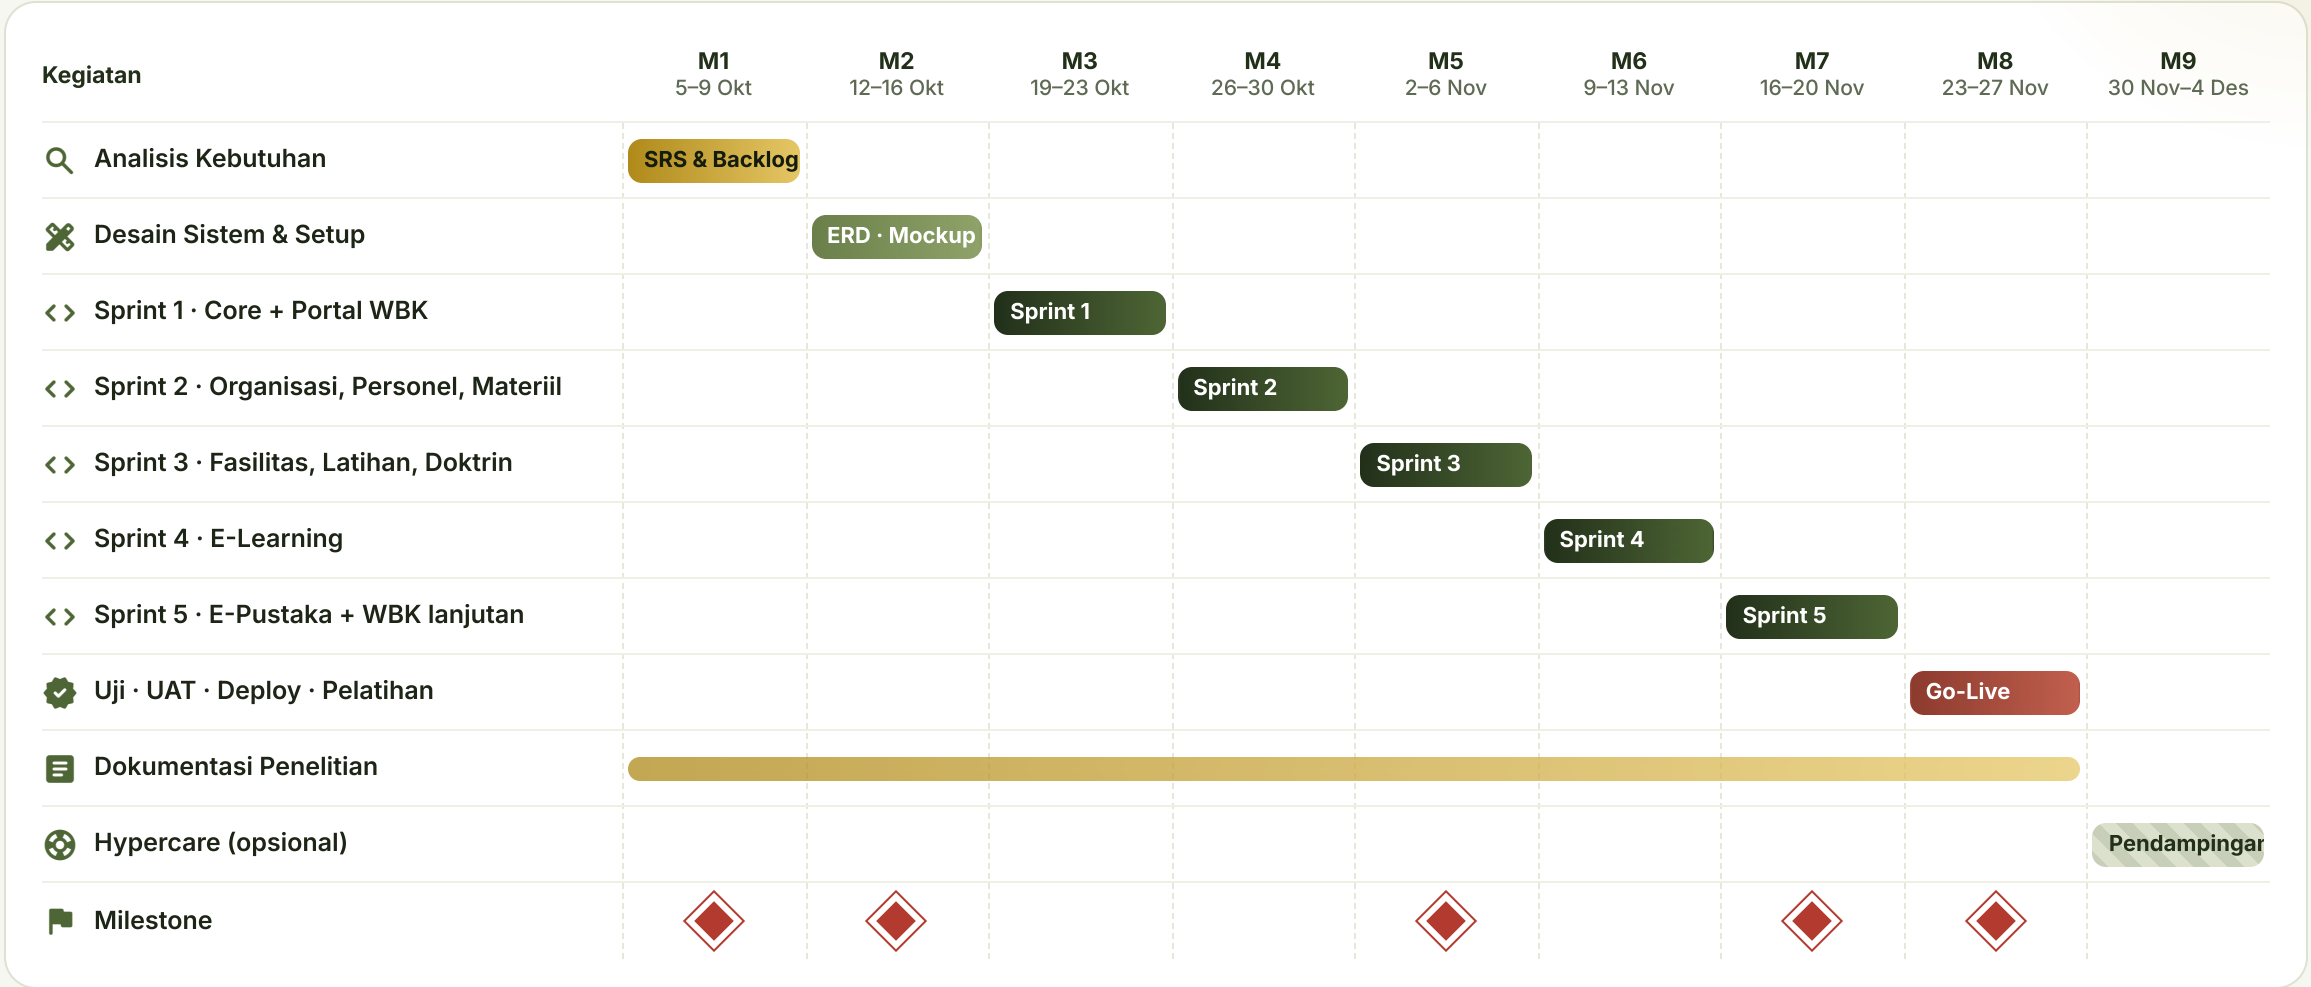

# Rincian Kegiatan per Minggu

Setiap minggu menghasilkan keluaran yang dapat didemokan dan diuji.

## MINGGU 1

### Analisis Kebutuhan

5–9 Okt 2026

- ◆ Kick-off & observasi
- ◆ Wawancara & studi dokumen
- ◆ Validasi rumus indeks

**Output:** SRS & Backlog

## MINGGU 2

### Desain & Setup

12–16 Okt 2026

- ◆ ERD & data dictionary
- ◆ Mockup UI (Figma)
- ◆ Repo, CI, staging

**Output:** Desain disetujui

## MINGGU 3 · SPRINT 1

### Core + Portal WBK

19–23 Okt 2026

- ◆ Login, 2FA, RBAC, audit log
- ◆ Master data satuan
- ◆ Portal publik ZI

**Output:** Portal WBK online

## MINGGU 4 · SPRINT 2

### Organisasi · Personel · Materiil

26–30 Okt 2026

- ◆ TOP/DSPP & gap
- ◆ Kekuatan & moril personel
- ◆ Inventaris, harwat, QR

**Output:** 3 komponen + laporan

## MINGGU 5 · SPRINT 3

### Fasilitas · Latihan · Doktrin

2–6 Nov 2026

- ◆ Aset & tiket perbaikan
- ◆ Program & hasil latihan
- ◆ Indeks & Dashboard

**Output:** SIM Binsat lengkap

## MINGGU 6 · SPRINT 4

### E-Learning

9–13 Nov 2026

- ◆ Kelas, mapel, materi
- ◆ Bank soal & ujian daring
- ◆ Nilai, rapor, sertifikat

**Output:** LMS siap ujian

## MINGGU 7 · SPRINT 5

### E-Pustaka + WBK Lanjutan

16–20 Nov 2026

- ◆ Katalog, reader, sirkulasi
- ◆ Pengaduan, gratifikasi, survei
- ◆ Notifikasi & hardening

**Output:** Feature Freeze

## MINGGU 8

### Uji · UAT · Go-Live


23–27 Nov 2026

- ◆ Performance & security test
- ◆ UAT, migrasi data, deploy
- ◆ Pelatihan & serah terima

**Output:** Aplikasi produksi

# Milestone Proyek

Titik kendali yang menjadi dasar persetujuan Product Owner dan laporan kepada pimpinan.

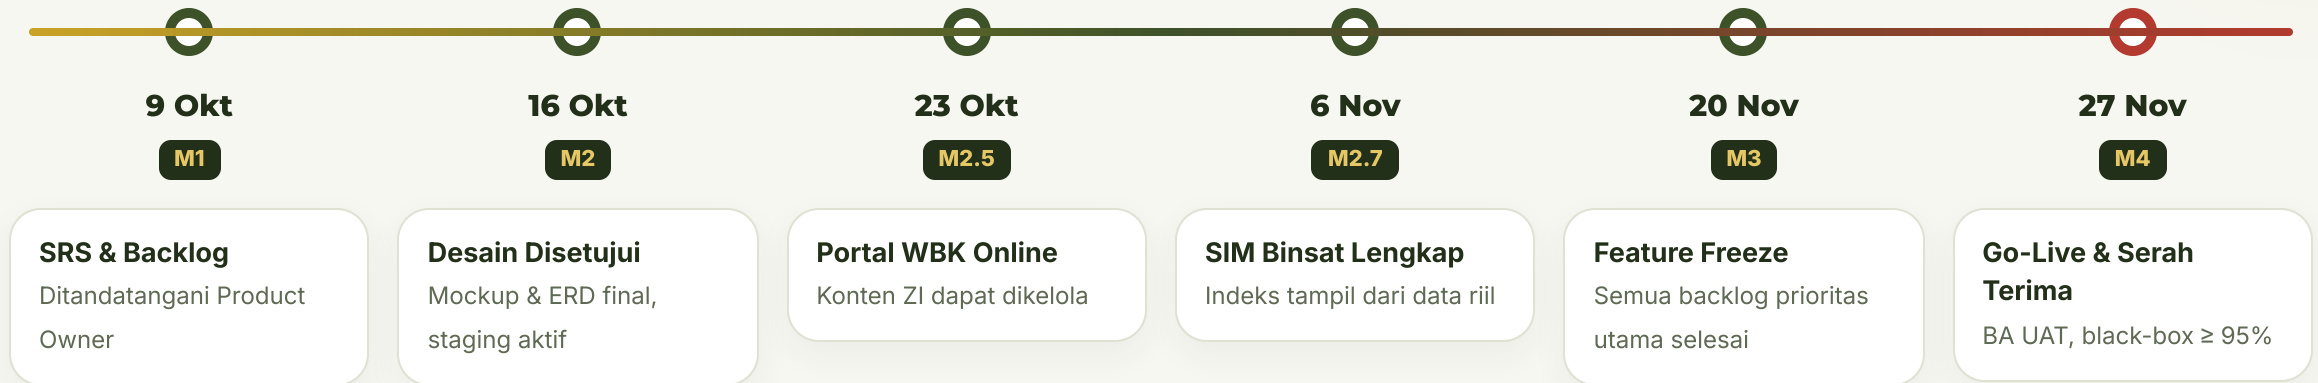

**Ritme mingguan:** Sprint Planning Senin 08.00 · Daily Scrum 15 menit · Sprint Review (demo) Jumat 13.30 · Retrospective Jumat 15.00 · Laporan 1 halaman ke pimpinan setiap Jumat.

# Tim Proyek & Manajemen Risiko

Kolaborasi tim pengembang dengan narahubung dari setiap seksi satuan.

|                                                                                     |                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|    | <b>Product Owner</b><br>Pejabat Rindam · prioritas & persetujuan      | <b>1</b> |
|    | <b>Project Manager / Scrum Master</b><br>Jadwal, koordinasi, laporan  | <b>1</b> |
|    | <b>System Analyst / Peneliti</b><br>Kebutuhan, dokumentasi, instrumen | <b>1</b> |
|    | <b>Backend Developer</b><br>Laravel, database, Filament               | <b>2</b> |
|    | <b>Frontend / UI Developer</b><br>Portal, LMS, Reader                 | <b>1</b> |
|  | <b>QA / Tester</b><br>Skenario uji & regresi                          | <b>1</b> |
|  | <b>Narahubung Seksi</b><br>Pers, Log, Ops, Perpus, Tim ZI             | <b>5</b> |

| Risiko Utama                          | Level  | Mitigasi                                               |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| Data riil terlambat diserahkan        | Tinggi | Minta sejak Minggu 1, template impor Excel, data dummy |
| Perubahan kebutuhan di tengah sprint  | Tinggi | Masuk backlog sprint berikutnya; satu Product Owner    |
| Kesibukan dinas narahubung            | Sedang | Jadwal UAT disepakati awal; tunjuk wakil               |
| Klasifikasi keamanan data belum jelas | Tinggi | Kebijakan klasifikasi ditetapkan Minggu 1              |
| Server/jaringan belum siap            | Tinggi | Ajukan kebutuhan server Minggu 2; staging cadangan     |
| Jaringan saat ujian serentak          | Sedang | Load test, ujian bergelombang, mode intranet           |
| Literasi digital pengguna beragam     | Sedang | UI sederhana, pelatihan per peran, video tutorial      |

# Keluaran Proyek & Pengembangan Lanjutan

Seluruh keluaran diserahkan kepada satuan pada akhir Minggu 8.



## Aplikasi Produksi

SIPANDU-WBK siap digunakan



## Kode Sumber

Repositori + riwayat Git



## Dokumen Penelitian

BAB I – V lengkap



## SRS, Blueprint, ERD

Dokumen desain sistem



## Laporan Pengujian

Black-box, performa, keamanan, SUS



## Manual Pengguna

Per peran + video tutorial



## Manual Admin

Deployment & pemeliharaan



## Berita Acara

UAT & serah terima



## Roadmap Pasca 2 Bulan

- v1.1** PWA (aplikasi ponsel) & notifikasi WhatsApp
- v1.2** Forum diskusi & gamifikasi belajar
- v1.3** Single Sign-On dengan sistem Kodam (jika diizinkan)
- v2.0** Analitik prediktif: kelulusan siswa & kerusakan materiil

# Keputusan yang Dibutuhkan dari Pimpinan

Empat hal berikut diperlukan sebelum kick-off Senin, 5 Oktober 2026.

1

## Penetapan Product Owner & Narahubung

Pejabat penanggung jawab prioritas dan persetujuan, serta narahubung dari seksi Pers, Log, Ops/Diklat, Perpustakaan, dan Tim ZI.

2

## Validasi Indikator Indeks Binsat

Rumus dan bobot 6 komponen disesuaikan dengan ketentuan resmi Binsat yang berlaku di satuan.

3

## Kebijakan Klasifikasi & Akses Data

Batas data yang boleh disimpan; data RAHASIA tidak masuk sistem.

Biasa

Terbatas

Rahasia — dikecualikan

4

## Lokasi Server & Akses Jaringan

Server satuan / data center Kodam / cloud pemerintah; Panel Staf hanya intranet atau juga internet.

Intranet + VPN

Internet + 2FA

♀ PENUTUP

# Terima **Kasih**

Satuan pendidikan yang **siap operasional**, **cerdas** dalam pembelajaran, dan **bersih** dari korupsi.

Sesi

Diskusi & Tanya Jawab

Kick-off

Senin, 5 Oktober 2026

Go-Live

Jumat, 27 November 2026

